Приложение № 5 к договору строительного подряда № _-2022 от __.__.2022г.
Attachment #5 to Construction Contract # _-2022 as of __.__.2022

# ГРАФИК / SCHEDULE
## строительства эксплуатационной скважины № 579 Средне-Майского месторождения / construction of production well # 579 of Middle-Maiskoye field

| Месторождение Field | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения drilling work scope, у. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средне-Майское месторождение / Middle-Maiskoye field | 579 | Подготовительные работы / Preparatory work | 35 | 01.01.2023 | 04.02.2023 | 4495 (+2281 pilot hole) |
| | | Мобилизация БУ / Dr.rig mobilization | 20 | 01.02.2023 | 20.02.2023 | |
| | | Монтаж / Rig-up | 35 | 21.02.2023 | 27.03.2023 | |
| | | Пуско-наладочные работы Commissioning works | 4 | 28.03.2023 | 31.03.2023 | |
| | | Бурение и крепление / Drilling and casing | 65 | 01.04.2023 | 04.06.2023 | |
| | | Демонтаж / Rig-down | 20 | 05.06.2023 | 24.06.2023 | |
| | | Ожидание вывоза БУ / Waiting for dr.rig demob | 200 | 25.06.2023 | 10.01.2024 | |
| | | Демобилизация БУ / Dr.rig demobilization | 25 | 11.01.2024 | 04.02.2024 | |
| | | Рекультивация / Reclamation | 123 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | |

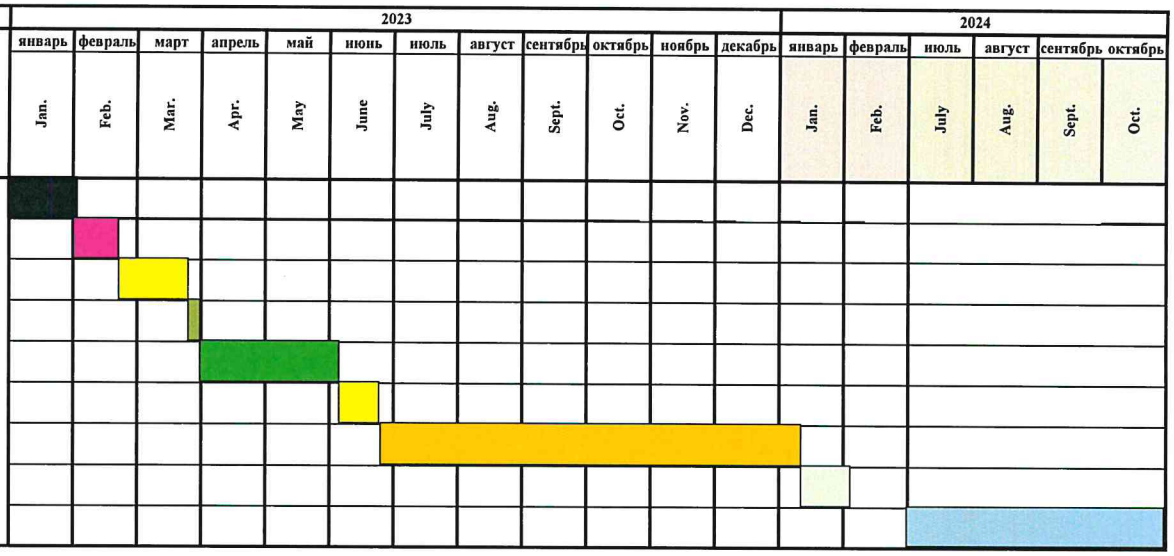


ЗАКАЗЧИК / CLIENT:

ООО "Альянснефтегаз"/ LLC Allianceneftegaz

Генеральный директор / General Director

_____ А.В. Бакланов / Baklanov A.V.

ПОДРЯДЧИК / CONTRACTOR:

___ «___» / ___ “___”

Генеральный директор / General Director

_____ _._ _____ / _____ _._
